



Stato di avanzamento degli interventi del Piano di Sviluppo – Monitoraggio 2026

RAPPORTO DI MONITORAGGIO ART. 60.3 TIQD

Verona, 31/03/2026

Livio Negrini

Consigliere Delegato e
Gestore Indipendente

V-RETI S.p.A.

Premessa

Il presente Rapporto di Monitoraggio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 60 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 27 dicembre 2023, n. 617/2023/R/eel, fornisce un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel Piano di Sviluppo 2025-2029 (PdS25).

Il documento restituisce un quadro di sintesi dell'avanzamento temporale ed è corredato da una rappresentazione tabellare e grafica che riporta, le informazioni relative allo stato di avanzamento e alle tempistiche di realizzazione.

In particolare, la sintesi consente di evidenziare, con riferimento al PdS25, gli elementi di maggiore rilievo in termini di andamento complessivo del Piano e di stato di attuazione degli interventi programmati.

Il Rapporto è strutturato in paragrafi tematici che consentono di analizzare il quadro economico, lo stato di avanzamento temporale e la classificazione degli interventi inclusi nel PdS25, con particolare riferimento agli aggiornamenti intervenuti nel periodo di monitoraggio.

Quadro di sintesi del Monitoraggio 2026

Il presente paragrafo fornisce un'analisi del quadro economico e dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel PdS25, con riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2025. A ciascun intervento incluso nel PdS25 è stato inoltre associato un codice intervento univoco, finalizzato a consentire l'identificazione puntuale dell'investimento, nonché il tracciamento e il monitoraggio dell'intervento nel tempo.

Gli interventi considerati nel presente Monitoraggio 2026 del PdS25 sono complessivamente 23, per un investimento complessivo a vita intera pari a 137.641.802 €.


Si evidenzia che nel PdS25 risultavano complessivamente 27 investimenti pubblicati; tuttavia, di questi, 3 interventi risultavano già completati nel corso del 2024 e 1 intervento era stato cancellato. Pertanto, nel presente monitoraggio i relativi investimenti non sono stati considerati, al fine di focalizzare l'analisi sugli interventi ancora in corso o pianificati. La tabella seguente riporta l'elenco degli interventi già completati nel corso del precedente Piano di Sviluppo 2023-2027.

Interventi completati nello scorso PdS 2023-2027	
Codice intervento	Nome Intervento
V-Reti - 2021 - 007	Rinnovo CP Verona Est - Revamping QMT 10 e 20 kV
V-Reti - 2023 - 018	Linee MT - Resilienza rete VI
V-Reti - 2025 - 027	Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 36 c/o Tombetta

Di seguito si riporta la tabella dell'intervento cancellato e della relativa motivazione.

Intervento cancellato nello scorso PdS 2023-2027		
Codice intervento	Nome Intervento	Motivazione
V-Reti - 2021 - 009	Rinnovo CP - Sostituzione trasformatori AT/MT	L'intervento è stato cancellato solo formalmente, in quanto suddiviso in più interventi distinti.


A livello di classificazione tecnica, 8 interventi riguardano la rete AT, 11 interessano la rete MT, 1 coinvolge sia MT che BT, mentre 2 interventi sono riferiti esclusivamente alla BT. È inoltre presente 1 intervento non associabile a una specifica classe di tensione, in quanto afferente al sistema ADMS, ovvero la piattaforma di teleconduzione e gestione della rete elettrica di Verona e Vicenza. Dal punto di vista territoriale, 14 interventi ricadono nell'area geografica di Verona, 3 riguardano l'area di Vicenza, mentre 6 interventi coinvolgono entrambe le aree.

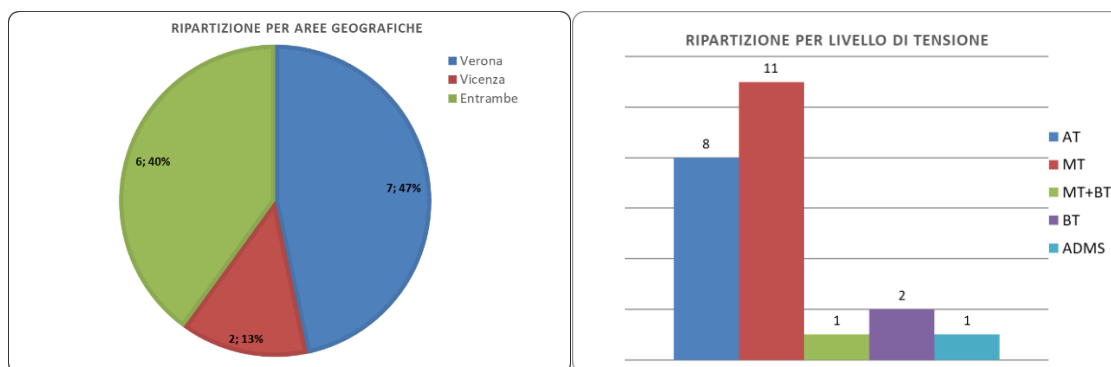

Analisi di avanzamento e costi degli interventi rispetto a PdS25

Con riferimento allo stato di avanzamento, 10 interventi risultano in linea con le tempistiche previste dal Piano (come da programma), 6 interventi presentano uno stato di avanzamento in ritardo, 1 intervento è stato cancellato ed 1 risulta essere in anticipo. I restanti 5 interventi sono riconducibili a interventi continuativi e ripetitivi nel tempo, identificati nel Piano dai codici intervento contenenti la dicitura "ROLL". Per tali interventi, poiché non associabili a una singola fase realizzativa, non è possibile definire uno stato di avanzamento temporale puntuale, che viene pertanto indicato come non applicabile (NA).

In termini di consistenza economica, gli interventi che risultano in linea con le tempistiche previste dal Piano presentano un valore di investimento complessivo pari a 40.420.293 €, mentre gli interventi in ritardo ammontano a 31.681.504€. Gli interventi di tipo "ROLL", per i quali non è possibile definire un avanzamento temporale puntuale ammontano complessivamente a 65.540.003€.

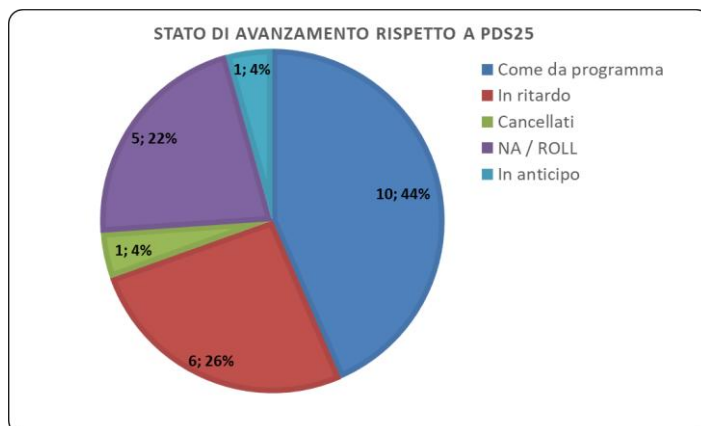

Analisi sullo stato degli Interventi

Considerando il perimetro dei 23 progetti presentati nel PdS25, l'analisi sullo stato di questi evidenzia che la parte più significativa del Piano risulta essere in costruzione (15 interventi). A questi si aggiunge 1 intervento suddiviso tra più stati:

- in costruzione,
- in autorizzazione,
- autorizzato e in fase di progettazione esecutiva.

Sono 5 gli interventi attualmente in stato "pianificato", con avvio lavori stimato intorno al 2028.

Si registra 1 intervento autorizzato e attualmente in fase di progettazione esecutiva ed 1 cancellato a seguito della mancata accettazione del preventivo da parte del richiedente.

